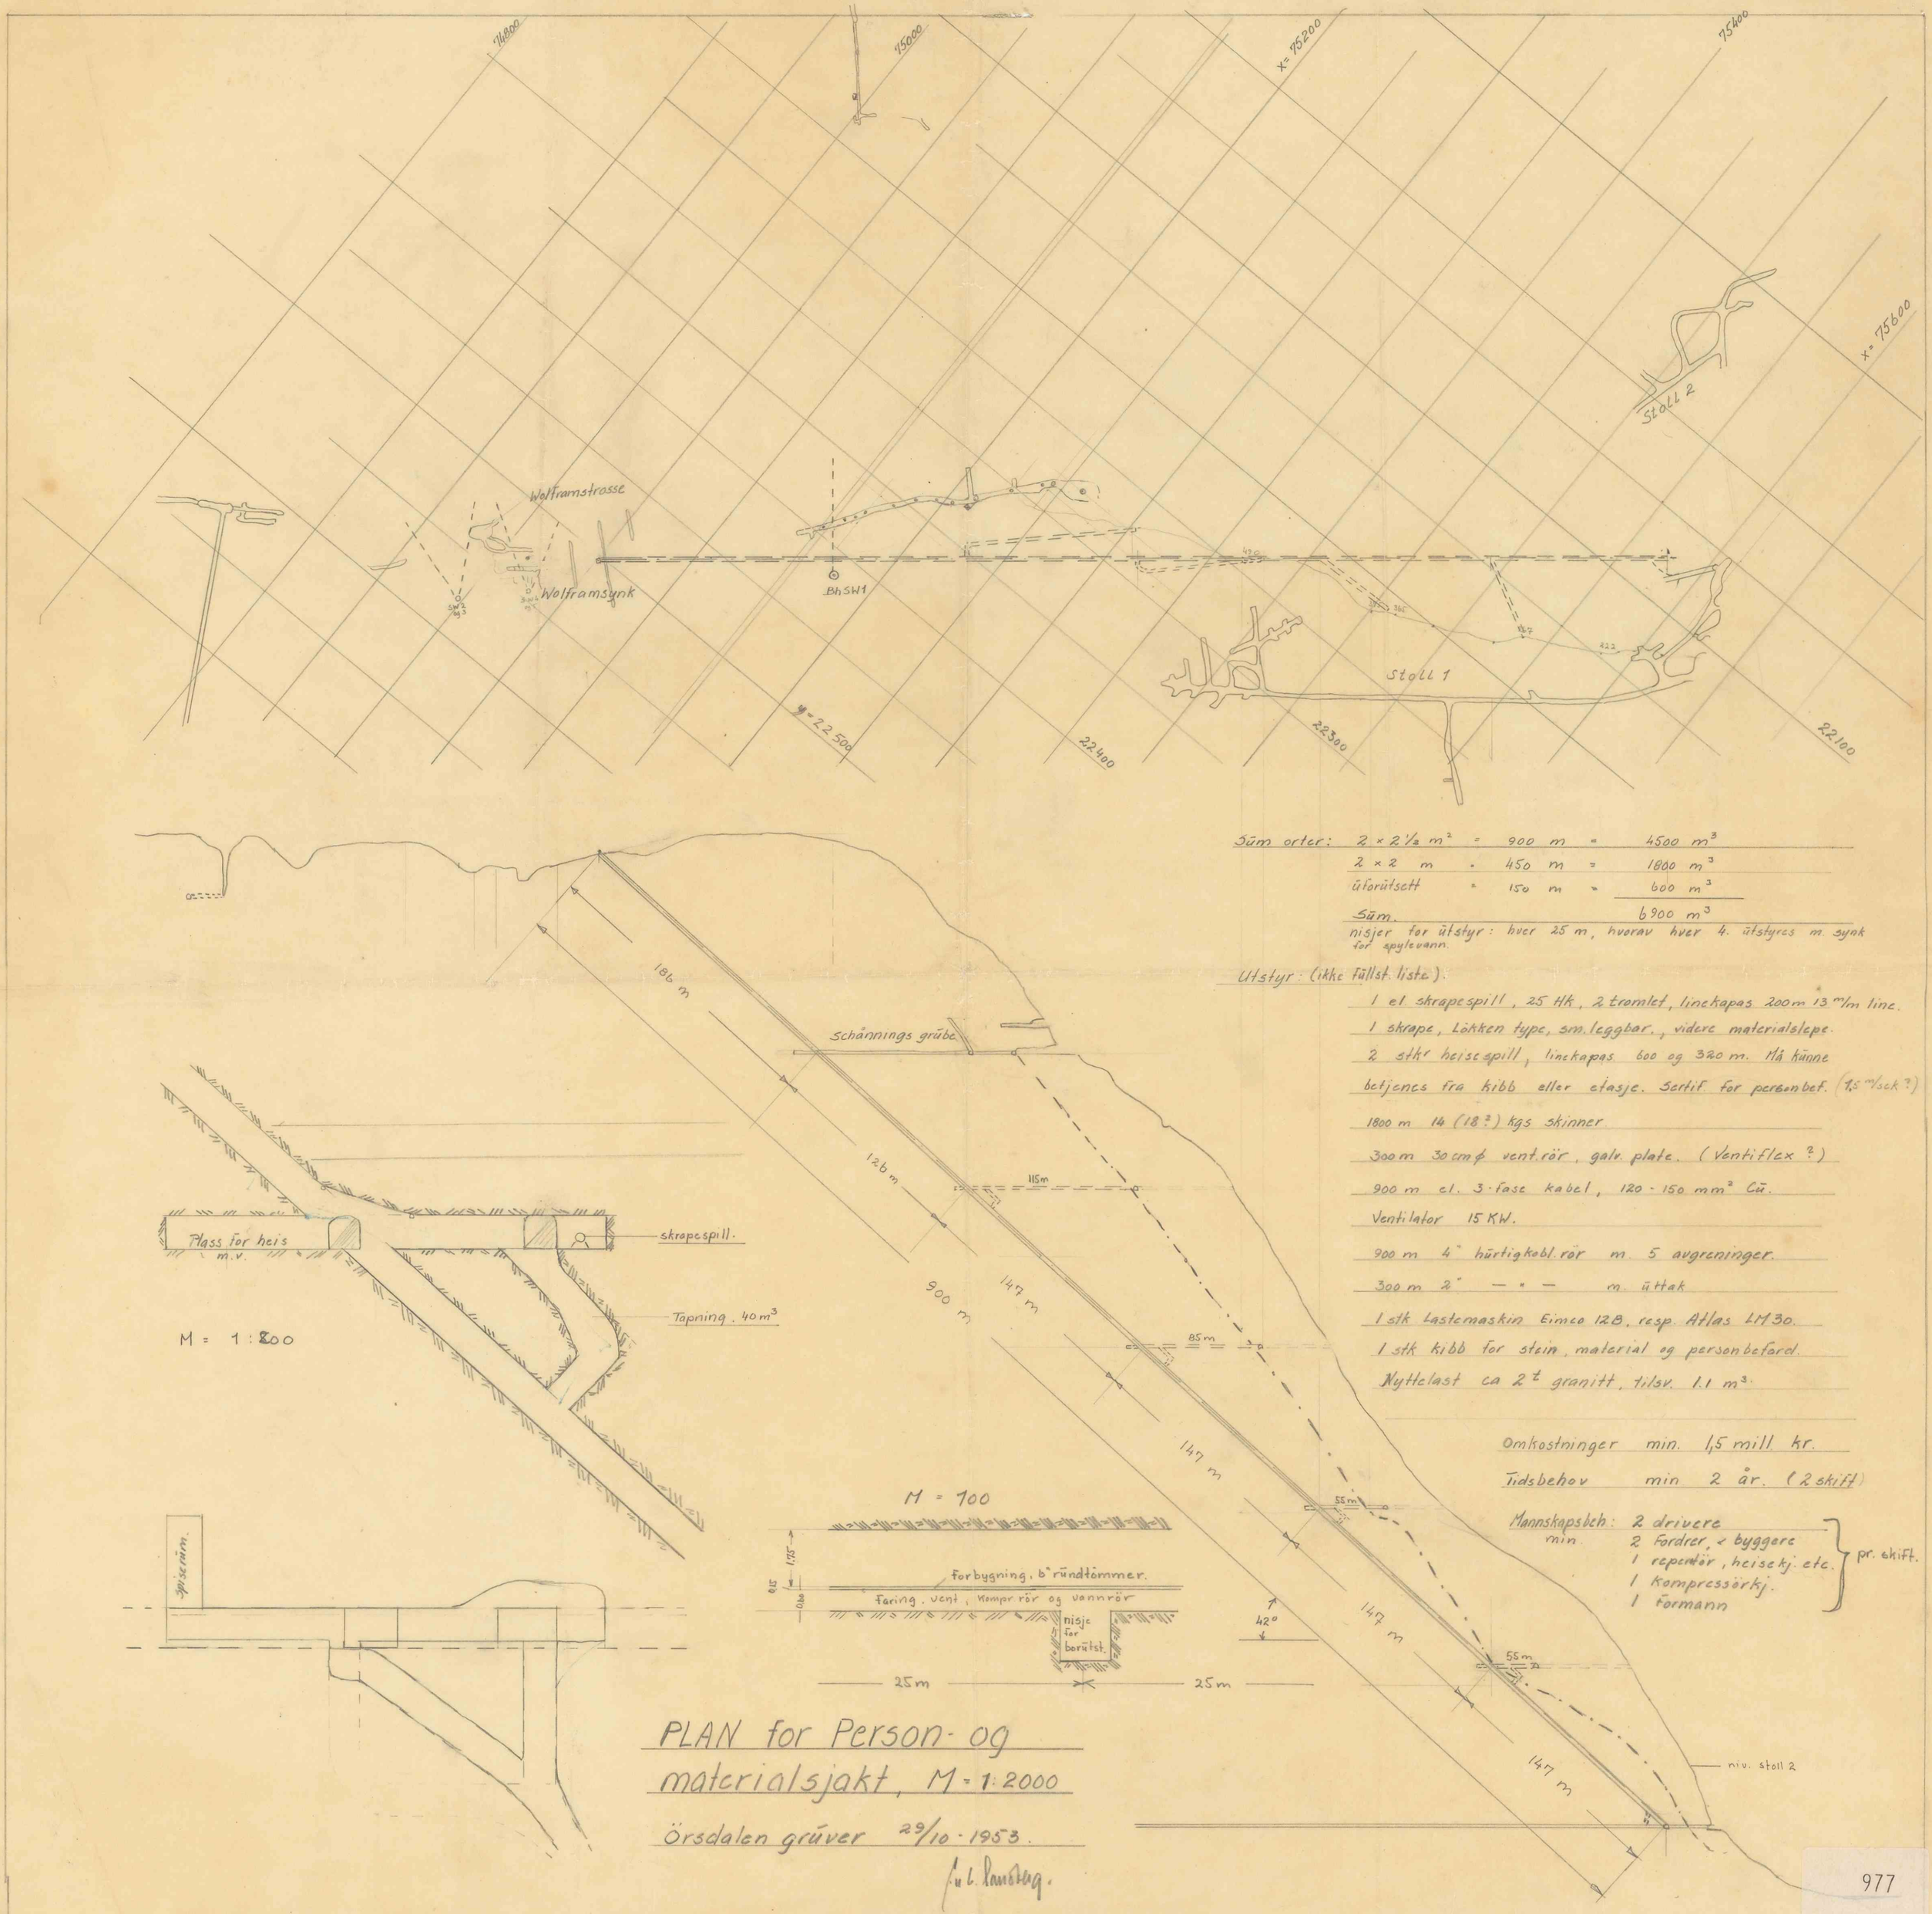

Sum orter:	2 × 2½ m²	= 900 m	=	4500 m³
	2 × 2 m	= 450 m	=	1800 m³
utforutsett		= 150 m	=	600 m³
Sum.				6900 m³

nisjer for utstyr: hver 25 m, hvorav hver 4. utstyres m. synk for spylevann.

Utstyr: (ikke fullst. liste):

1 el. skrapespill, 25 Hk, 2 tromlet, linekapas 200m 13 m/m line.
1 skrape, Lokken type, sm. leggbar., videre materialslepe.
2 stkr heisespill, linekapas 600 og 320 m. Må kunne betjenes fra kibb eller etasje. Sertif. for personbef. (1,5 m/sek ?)
1800 m 14 (18 ?) kgs skinner
300 m 30 cm ø vent. rör, galv. plate. (Ventiflex ?)
900 m el. 3-fase kabel, 120 - 150 mm² Cu.
Ventilator 15 KW.
900 m 4" hurtigkobl. rör m 5 avgreninger.
300 m 2" — " — m. uttak
1 stk Lastemaskin Eimco 12B, resp. Atlas LM 30.
1 stk kibb for stein, material og personbeford.
Nyttelast ca 2 t granitt, tilsv. 1.1 m³.

Omkostninger min. 1,5 mill kr.

Tidsbehov min 2 år. (2 skift)

Mannskapsbeh. min.:
2 drivere
2 fordrer, 2 byggere
1 reparatör, heisekj. etc.
1 kompressörkj.
1 formann
} pr. skift.

PLAN for Person- og materialsjakt, M = 1:2000

Örsdalen gruver 29/10 - 1953.

f.u.l. Ramstad.
